

САМОСТІЙНА РОБОТА

Project Outline

Цілі

- Ввійти в топ 10 Українських фільмів за переглядами
- Отримати за перші 4 тижні 300 000 переглядів фільму в кінотеатрах

Ресурси

- Бюджет 15 000
- Тривалість 01.06 - 17.01

Поставки

- Сторінки фільму в соціальних мережах
 - Facebook
 - YouTube
 - Instagram
 - Telegram канал
 - Twitter
- Білборди, плакати, листівки
 - 2 зображення для білбордів
 - 3 листівки
- Відео, зображення, тексти для соціальних мереж та телебачення
 - 3 відео: 1 для YouTube, 2 для телебачення
 - 3 зображення для соціальних мереж
 - 1 текст для соціальних мереж

Ментальна карта

- Аналіз цільової аудиторії (для кого робимо рекламу)
 - Аналіз переглядів наявних фільмів такого ж жанру
 - Опитування в соціальних мережах
 - Подивитись опис фільму від виробника
- Обрання каналів для просування
 - Реклама на сайтах: банери, ютуб вставки
 - Реклама в соціальних мережах: телеграм, інстаграм, фейсбук, суспільні діячі ютуб
 - Білборди по місту
 - Роздавання листівок
 - Надсилання реклами на пошту, якщо користувач підписаний на розсилку від сайту
 - Телебачення
 - Радіо
 - Кінотеатри
 - Сайт фільму, окремі сторінки в соціальних мережах

Для обрання каналів просування можна подивитись який тип реклами краще працює в різних регіонах. Також можна подивитись які типи реклами загалом є ефективними.

Ефективні канали просування:

1. Сайти
2. Соц. мережі
3. Білборди, кінотеатри

4. Телебачення

- Розробка рекламних матеріалів (що саме будемо робити)
 - Банери для сайтів
 - Зображення та повідомлення для соц. мереж
 - Зображення для білбордів та кінотеатрів
 - Відео для телебачення
- Організація заходів
 - Допрем'єрний показ на кінофестивалі
 - Прем'єра фільму
 - Прес-реліз: інтерв'ю з акторами і виробниками
 - Особисті покази, презентації
- Моніторинг та аналіз ефективності
 - Кількість переглядів фільму
 - Відгуки людей на презентаціях, переглядачів на сайтах
 - Взаємодія з рекламою на сторінках в соц. мережах (кількість лайків, репостів, переглядів)
 - Активність кінотеатру, де рекламували
 - Збори після релізу фільму

Каталог ризиків

Ризик	Вплив	Стратегія вирішення	Відповідальна особа
Низька ефективність реклами	Негативний	Щоб не настав: більший час розробки промо-матеріалів, краще вивчення ринку Якщо настав: кращий аналіз цільової аудиторії, зміна каналів просування	Маркетингова команда
Нестача бюджету	Негативний	Щоб не став: краще	Маркетингова

		планування бюджету етапів та задач Якщо настав: прохання додати коштів, зміна плану робіт	команда
Конкуренція з іншими рекламними фірмами	Позитивний	Покращення якості реклами	Маркетингова команда

Проектна команда

- Працівники

- Менеджер - керування життєвим циклом
- Аналітик - аналіз ринку та цільової аудиторії
- Маркетолог - просування реклами
- Дизайнер - створення картинок, банерів
- Відео продюсер - створення відео
- Копірайтер - написання текстів

- Інвестори

- Замовник (Маркетинговий менеджер) - дає завдання на проєкт
- Інвестор (Виробники фільму) - дає гроші на проєкт

- Платформи

- Соціальні мережі
- Кінотеатри
- Білборди в місті

WBS

Назва задачі	Тривалість (годин)
Аналіз цільової аудиторії	
Зібрати інформацію про потенційного глядача	32
Скласти портрет глядача	12
Обрати канали для просування	4
Скласти список медіа каналів	
Instagram, TikTok, Facebook, Telegram канали	10
YouTube канали (блогери)	6
Телеканали	4
Власники білбордів	8
Громадські заклади (кінотеатри)	8
Домовитися з власниками медіа каналів	
Описати формат <u>поставок</u>	20
Прописати та <u>заклучити договір</u>	24
Створити сторінки (в соц. мережах)	
Instagram	4
Facebook	4
Telegram	2
TikTok	2
Google Ads	2
YouTube	2
Розробити креативну концепцію	
Підготувати рекламний текст	20
Розробити рекламні банери/постери	40
Підготувати креативи	40
Розробити контент-план	16
Протестувати креативи	8
Затвердити маркетингові матеріали	8
Затвердити бюджет по проєкту	8
Підготуватись до <u>івентів</u>	
Підготувати та надати рекламні матеріали	16
Написати та розіслати запрошення	12
Підготувати прес-реліз до фільму	12
Провести репетиція інтерв'ю	16
Підготувати анкету	16
Запустити рекламу згідно з контент-планом	
Проаналізувати ефективність рекламних каналів	
Аналіз активності користувачів в соц. мережах	32
Аналіз активності користувачів на сторінках кінотеатрів	8
Скласти проміжний звіт	8
Адаптувати канали просування	20
Адаптувати рекламу	40
Моніторинг продажу квитків в кінотеатрах	16
Проведення <u>івентів</u>	
Провести інтерв'ю/опитування	4
Створити звіт з відгуками	8
Аналіз результатів кампанії	
Звіт по таргетованій рекламі	4
Звіт по рекламах (канали та <u>пабліки</u>)	4
Звіт по контекстній рекламі	4
Звіт по кінотеатрах	4
Звіт по відгуках від глядачів (учасників фестивалю)	6
Підсумковий звіт	6

До таблиці було додано тривалості робіт за прикладом на відео.

GanttPRO

Створено віртуальні ресурси:

WBS

☆

Без статусу

▼

Діаграма Ганта

Дошка

Список

Календар

Навантаження

Люди

Приладна панель

Люди

Віртуальні ресурси


Тут ви керуєте всіма віртуальними ресурсами вашого проекту. Вони не працюють над проектом. Ви лише призначаєте їм завдання. «Дизайнер», «розробник», «будівельник» може бути віртуальним ресурсом, наприклад, «вантажівка», «сервер», «підтримка». Ви можете створити новий ресурс або вибрати з ресурсів команди. Ви також можете встановити для них витрати.

🔍

Пошук за назвою ресурсу

☐	Ресурс	Тип
☐	Аналітик	за годину ▼
☐	Відео продюсер	за годину ▼
☐	Дизайнер	за годину ▼
☐	Копірайтер	за годину ▼
☐	Маркетолог	за годину ▼

На діаграму додано задачі:

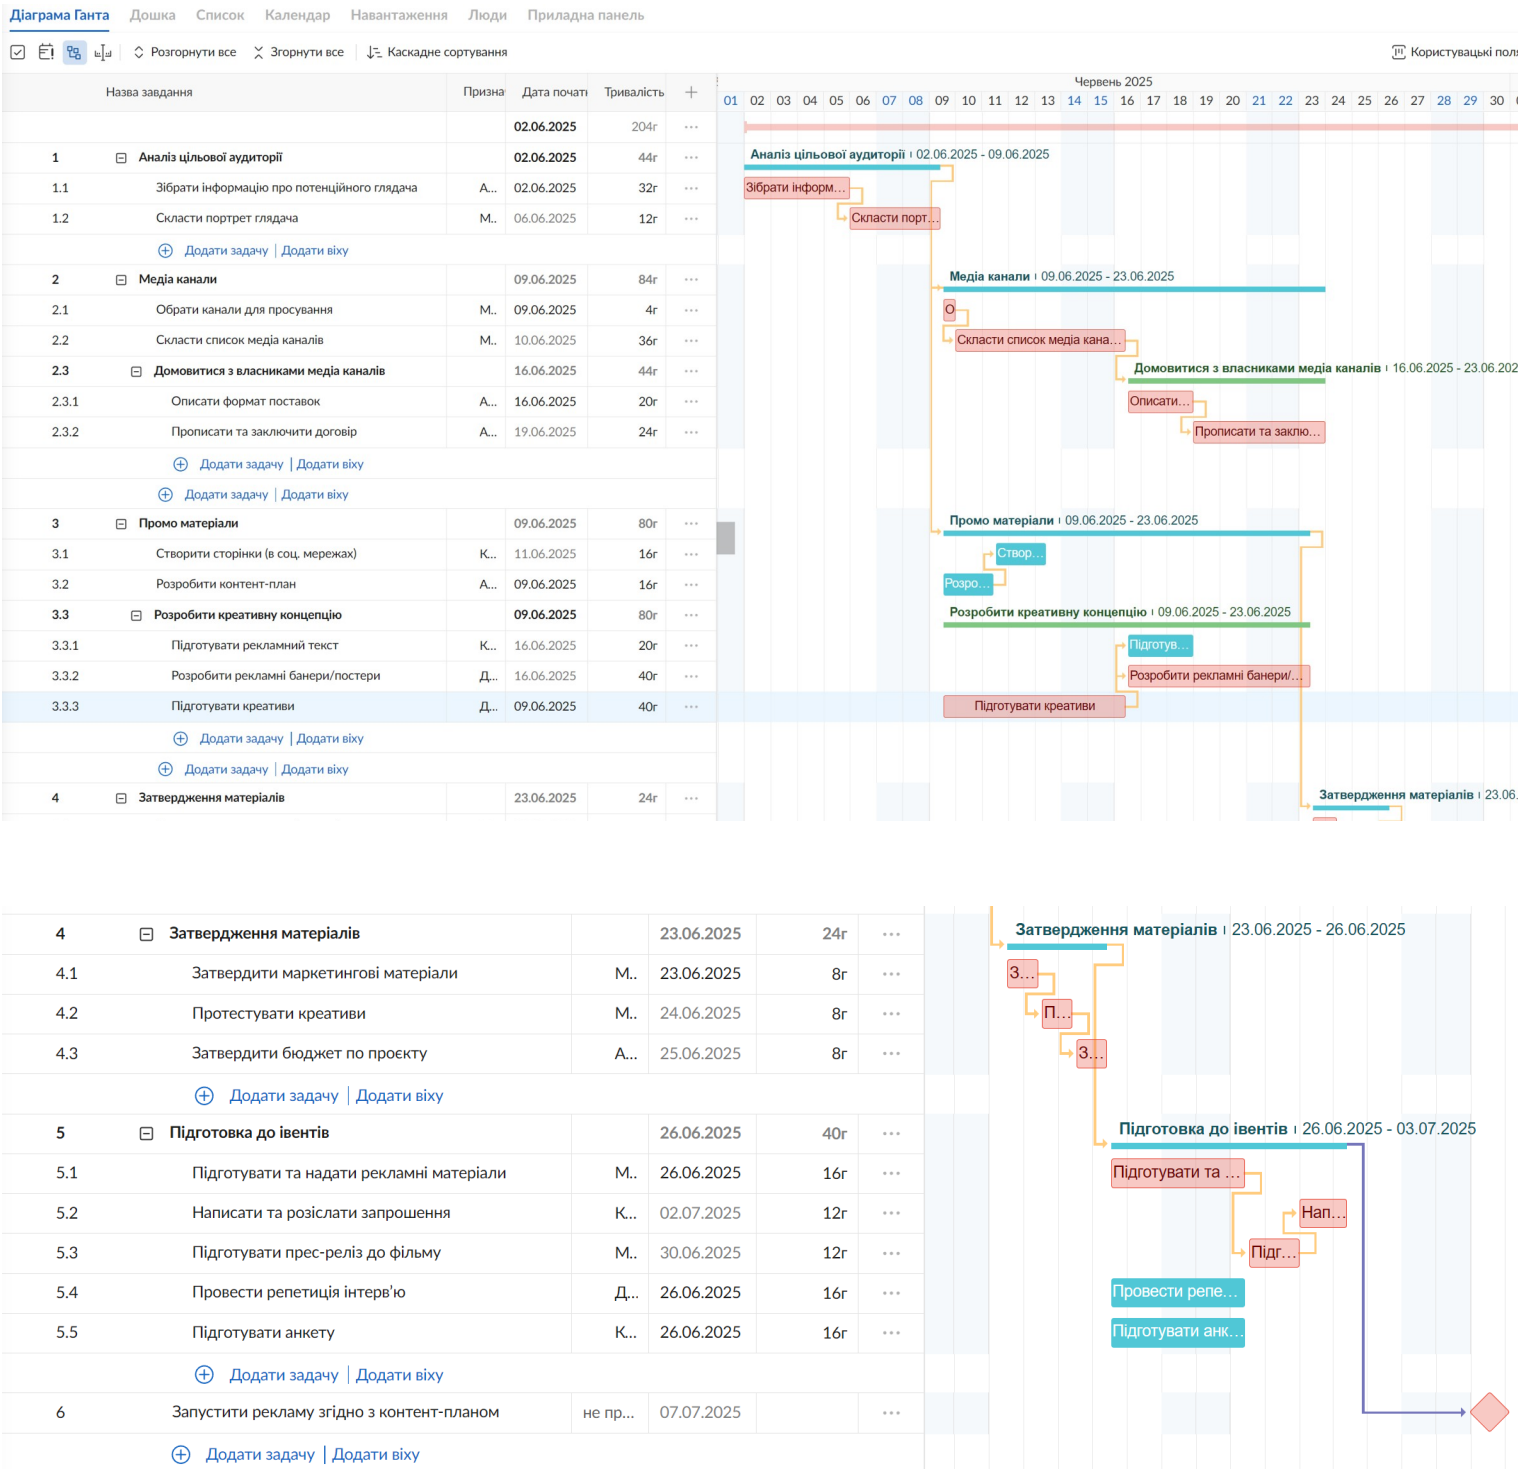


До задач додано працівників. Для кожної визначено дату початку і тривалість.

Залежності змінено так, щоб всі задачі були виконані до запуску реклами. Це зроблено паралельним виконанням медіа каналів та промо матеріалів.

В інструменті Trello було додано по одній задачі з кожної категорії на діаграмі:

Trello

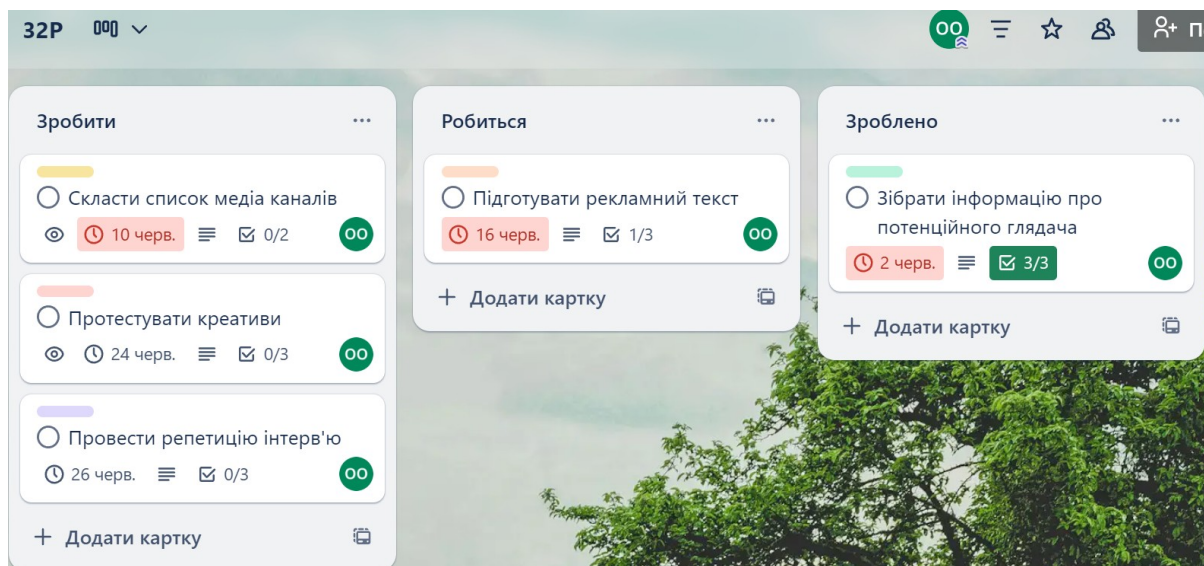

Зробити ▾



○ Скласти список медіа каналів

+ Додати

✉ Перелік

📎 Вкладення

Учасники



Мітки

Медіа канали



Дата завершення

10 черв., 19:17

Протерміновано ▾

☰ Опис

Редагувати

Платформи:

- Telegram
- Instagram
- YouTube
- Facebook
- Twitter

Для кожної зібрати 5 каналів з мінімум 10 000 підписників. Тематика: фільми.

В таблицю написати:

- назва платформи (Telegram / Instagram / ...)
- посилання на канал
- кількість підписників

☑ Кроки

Видалити

0%

☐ Скласти список каналів

☐ Заповнити таблицю

Додати пункт



Зробити ▾



○ Протестувати креативи

+ Додати

☑ Перелік

📎 Вкладення

Учасники



Мітки

Затвердження матеріалів



Дата завершення

24 черв., 19:17 ▾



Опис

Редагувати

Зібрати групу з 10 людей, яким цікаві фільми.

Показати їм зроблені картинки та тексти.

Зібрати їх відгуки шкалою від 1 до 10.



Кроки

Видалити

0%



☐ Зібрати людей



☐ Показати креативи



☐ Зібрати відгуки

Додати пункт



Зробити ▾



○ Провести репетицію інтерв'ю

+ Додати

✉ Перелік

📎 Вкладення

Учасники

Мітки

Дата завершення



Підготовка до івентів



26 черв., 19:17 ▾



Опис

Редагувати

Зібрати акторів та продюсерів фільму.

Придумати можливі питання інтерв'юєрів. Питання розбити для кожного типу особи (актор чи продюсер).

Спитати людей відповіді на їхні питання.



Кроки

Видалити

0%



Зібрати людей



Придумати питання



Поставити питання для кожного

Додати пункт



Робиться ▾



○ Підготувати рекламний текст

+ Додати

✉ Перелік

📎 Вкладення

Учасники



Мітки

Промо матеріали



Дата завершення

16 черв., 19:17

Протерміновано ▾



Опис

Редагувати

Зрозуміти жанр фільму, бажання замовника.

Прочитати анотацію і витягнути основні сюжетні моменти.

Коротко описати сюжет фільму.



Кроки

Приховати відмічені пункти

Видалити

33%



Подивитись інформацію про фільм



Передивитись анотацію



Написати текст

Додати пункт



Зроблено ▾



○ Зібрати інформацію про потенційного глядача

+ Додати

☑ Перелік

📎 Вкладення

Учасники

Мітки



Аналіз цільової аудиторії



Дата завершення

2 черв., 19:17

Протерміновано ▾

☰ Опис

Редагувати

Записати 5 схожих фільмів.

Подивитись 5 профілів, які постили щось про кожен з фільмів у Facebook.

У результатуючу таблицю записати вік, стать, освіту людей.

☑ Кроки

Приховати відмічені пункти

Видалити

100%

☑ Обрати 5 фільмів

☑ Подивитись по 5 профілів

☑ Скласти таблицю

Додати пункт



Після цього було використано ШІ для виконання того ж завдання:

РОБОТА З ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Project Outline

Цілі проєкту

Інформаційна ціль — донести до широкої аудиторії ідею згуртованості українців під час війни через документальний фільм.

Промоційна ціль — організувати ефективну рекламну кампанію фільму до допрем'єрного та прем'єрного показу.

Комерційна/метрична ціль — увійти в топ-10 українських фільмів за кількістю переглядів протягом перших 4 тижнів показу.

Критерій успіху:

Успішно: $\geq 300\,000$ переглядів у кінотеатрах України.

Неуспішно: $< 300\,000$ переглядів.

Ресурси

Вхідні матеріали:

1 розширена анотація до фільму з описом сюжету, акторів та фото (16 шт.).

8 тизерів (до 20 сек).

2 трейлери (до 2 хв).

Ліцензії на використання фото/відео для маркетингу.

Команда:

ІТ-менеджер (ви)

Дизайнери (графіка/відео)

SMM/таргетинг-менеджер

Копірайтери

PR-спеціалісти

Технічні фахівці для організації онлайн-ресурсів

Бюджет:


До \$15 000 (усі послуги включено)

Поставки (Deliverables)

Етап	Продукт/результат	Термін
1. Організаційна зустріч	Затверджений план робіт	01.06
2. Промо-матеріали	Дизайн, монтаж, копірайт, адаптація матеріалів	до 05.07
3. Публікація	SMM, сайти, відеохостинги, таргетована реклама	07.07
4. Завершення пост-продакшну	Повністю готовий фільм	31.08
5. Допрем'єра	Презентація на Cinema International	23.10
6. Прем'єра	Масовий прокат в Україні	20.12
7. Аналітика	Статистика переглядів і відгуки	до 17.01

Ментальна карта

Проект "Нескорені"

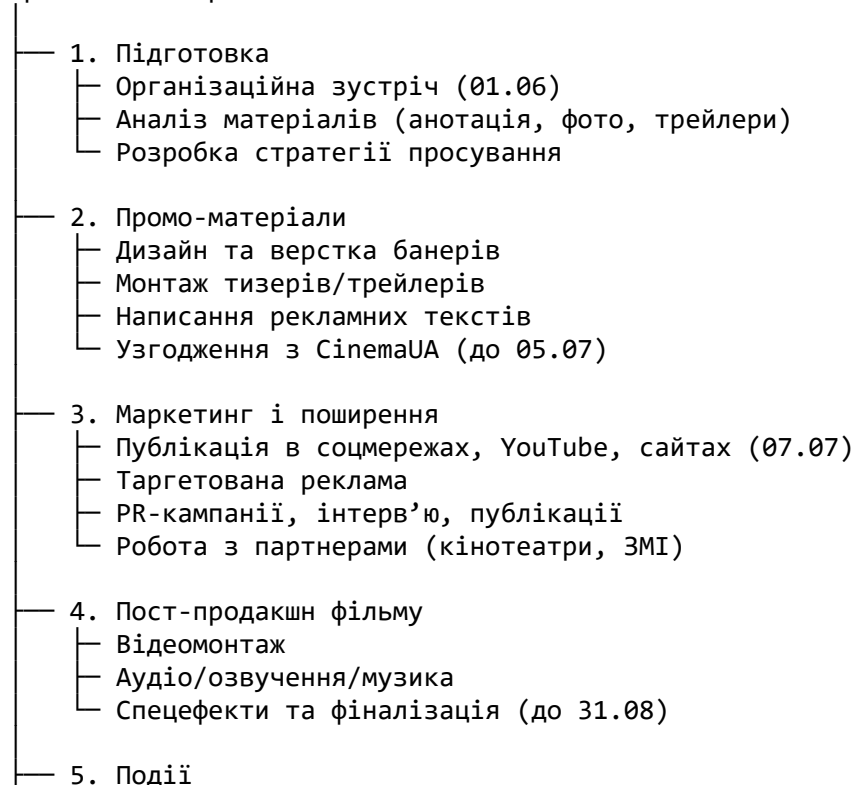

- Допрем'єрний показ (23.10)
 - Промоція події (запрошення ЗМІ, блогерів)
 - Прем'єра в Україні (20.12)
6. Аналіз і звітність
- Збір статистики переглядів
 - Оцінка охоплення реклами
 - Порівняння з KPI (300 тис. переглядів) (до 17.01)

Каталог ризиків

№	Назва ризику	Вплив	План реагування	Відповідальна сторона
1	Затримка пост-продакшну	Порушення графіку, відтермінування прем'єри	Регулярний моніторинг статусу; буфер часу в плані	Продакшн-команда
2	Низька ефективність реклами	Недосягнення мети (менше 300 тис. переглядів)	А/Б тестування, коригування таргету, перезапуск кампаній	Digital-маркетолог, SMM
3	Відсутність згоди з боку правовласника	Заборона на публікацію матеріалів	Отримання письмових ліцензій до старту	Юрист, менеджер проєкту
4	Недотримання бюджету (\$15 000)	Неможливість завершити окремі етапи	Постійний контроль витрат, фінансовий план з резервом	Проектний менеджер, фінансист
5	Технічні проблеми на сайтах/платформах	Зрив запуску реклами або онлайн-показів	Залучення технічного спеціаліста, бекапи, дублювання контенту	ІТ-відділ, адміністратор систем
6	Негативна реакція аудиторії	Зниження інтересу, репутаційні втрати	Модерація коментарів, комунікаційна стратегія, робота з медіа	PR-менеджер
7	Зміни політичної ситуації	Можливе відтермінування або заборона	Альтернативні дати/локації, гнучкий план	Вищий менеджмент, юридичний

№	Назва ризику	Вплив	План реагування	Відповідальна сторона
		подій		відділ
8	Конфлікт інтересів між сторонами	Ускладнення узгоджень	Регулярні зустрічі, чітка документація домовленостей	Менеджер проекту

Проектна команда

Працівники

Роль	Обов'язки	Хто це
Менеджер проекту (PM)	Загальне управління проектом, контроль дедлайнів і бюджету, комунікація зі сторонами	Ви (ІТ-менеджер агенції)
Маркетолог / Digital Strategist	Розробка рекламної стратегії, підбір каналів просування, аналітика	Спеціаліст агенції
SMM-менеджер	Публікації в соцмережах, таргетована реклама, взаємодія з аудиторією	Працівник агенції
Дизайнер	Створення візуального контенту (банери, тизери)	Графічний дизайнер
Монтажер	Підготовка тизерів, трейлерів	Відеоредактор, фріланс або студія
Копірайтер	Написання рекламних текстів, постів, заголовків	Контент-менеджер агенції
PR-менеджер	Робота з медіа, організація публічних подій, створення прес-релізів	Агенція або залучений консультант
Технічний спеціаліст (DevOps / Web)	Підтримка платформи, вирішення технічних проблем	ІТ-відділ
Юрист / Legal advisor	Ліцензії, договори, ризики	Або залучений спеціаліст

Інвестори

Назва	Роль	Очікування
CinemaUA (дистриб'ютор)	Замовник проєкту	Прем'єра, широкий прокат, позитивний імідж
Студія-виробник фільму	Постачальник контенту	Якісний продукт і ліцензії
Агенція (ви)	Виконавець	Просування та організація
Можливі партнери (опціонально)	Спонсори або партнери допрем'єрного показу	Інформаційна та фінансова підтримка

Платформи


Платформа	Призначення
Facebook / Instagram	Основний канал для SMM і реклами
YouTube	Розміщення трейлерів, прем'єр, інтерв'ю
TikTok	Актуальний відеоконтент для молодшої аудиторії
Офіційний сайт фільму або лендинг	Уся інформація про фільм, тізери, квитки
Кінотеатри (мережі: Планета Кіно, Multiplex і т.д.)	Прокат, анонси
Преса, блоги, новинні сайти	PR-кампанія та статті
Платформи квитків (Concert.ua, TicketsBox)	Продаж квитків на допрем'єрні покази

WBS

№	Задача	Підзадача	Тривалість (год)
1	Планування	Організаційна зустріч з командою	2
		Складання проєктного плану (Gantt, бюджет, ризики)	6
		Узгодження з замовником (CinemaUA)	3
2	Аналіз матеріалів	Перевірка фото/відео/анотацій	4

№	Задача	Підзадача	Тривалість (год)
		Підготовка технічного завдання для команди	3
3	Розробка промо-матеріалів	Монтаж тизерів і трейлерів	20
		Графіка/банери/афіші	16
		Копірайтинг (анонси, опис відео, пости)	10
4	Онлайн-просування	Створення контент-плану для соцмереж	4
		Налаштування таргетованої реклами	6
		Публікації, аналітика ефективності	18
5	Організація подій	Допрем'єрний показ (планування, запрошення)	12
		Прем'єрний показ (координація, реклама)	12
6	Пост-продакшн (моніторинг)	Контроль за завершенням фільму	6
		Комунікація з пост-продакшн командою	4
7	Аналітика й звітність	Збір даних (перегляди, охоплення)	6
		Підготовка фінального звіту	4

GanttPRO

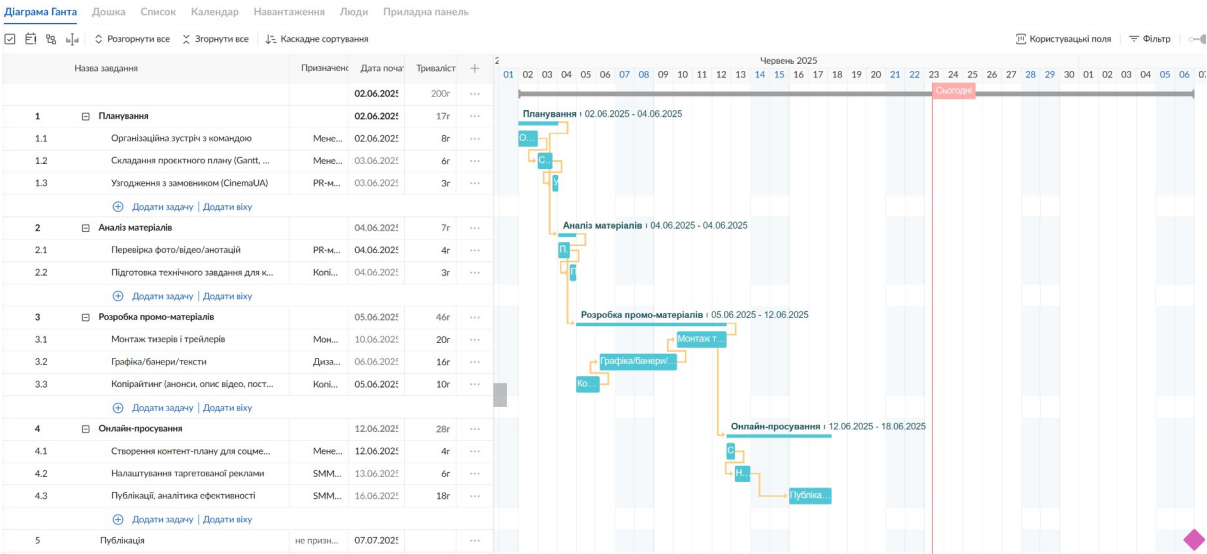

Задачі було додано вручну, виконавців було додано зі списку з попереднього кроку, тривалості додано з таблиці WBS.

Trello

За запитом з використанням техніки SMART було створено три картки з різних категорій:

Задача 1

Назва: Затвердити візуальні матеріали для промо-кампанії

Стадія: Підготовка промо-матеріалів

Дата завершення: 05.07

Опис:

Створити та погодити з СінемаUA ключові графічні банери, тизери та трейлери. Головна мета — мати повний комплект візуальних матеріалів, придатних для публікації у соцмережах, YouTube і сайтах партнерів.

Що поставити: затверджені JPG/PNG банери, MP4 тизери, погоджений список матеріалів.

Кроки виконання:

Проаналізувати надані матеріали (анотація, фото, трейлери)

Створити 3 варіанти банерів (FB, IG, TikTok формат)

Підготувати титри/субтитри до тизерів

Надіслати СінемаUA для затвердження

Отримати письмове підтвердження (email/чат/підпис у Figma)

Задача 2

Назва: Запустити рекламну кампанію у Facebook/Instagram

Стадія: Онлайн-просування

Дата завершення: 08.07

Опис:

Створити та запустити рекламну кампанію з тизерами фільму для залучення уваги до прем'єри. Мета — зібрати щонайменше 100 000 охоплень у перші 5 днів.

Що поставити: звіт з Meta Ads, скріншоти кампаній, статистика охоплень.

Кроки виконання:

Вибрати тизер (до 20 сек) для реклами

Сформулювати заклик до дії (СТА) для поста

Створити аудиторії (гео: Україна, вік: 16–60)

Запустити кампанію (платформа Meta Ads Manager)

Через 3 дні перевірити результат і оптимізувати

Задача 3

Назва: Організувати допрем'єрний показ на "Cinema International"

Стадія: Організація подій

Дата завершення: 15.10

Опис:

Підготувати все необхідне для допрем'єри: презентація фільму, прес-запрошення, логістика. Мета — забезпечити професійну присутність бренду й успішну публічну реакцію.

Що поставити: список гостей, план показу, оформлені прес-запрошення.

Кроки виконання:

Зв'язатися з організаторами кінофестивалю

Узгодити слот показу і технічні вимоги

Підготувати презентаційні матеріали

Сформувати список преси та інфлюенсерів

Відправити запрошення

Перевірити готовність техніки за 2 дні до події

Зробити

Організувати допрем'єрний показ на "Cinema International"

🕒 15 жовт. 📅 0/6

🔍

+ Додати картку 📄

Робиться

Запустити рекламну кампанію у Facebook/Instagram

🕒 8 лип. 📅 2/5

🔍

+ Додати картку 📄

Зроблено

Затвердити візуальні матеріали для промо-кампанії

🕒 4 лип. 📅 5/5

🔍

+ Додати картку 📄

Робиться ▾

○ Запустити рекламну кампанію у Facebook/Instagram

+ Додати

✉ Перелік

📎 Вкладення

Учасники

Мітки

Дата завершення

 +

Онлайн-просування

+

8 лип., 09:28 ▾

☰ Опис

Редагувати

Створити та запустити рекламну кампанію з тизерами фільму для залучення уваги до прем'єри. Мета — зібрати щонайменше 100 000 охоплень у перші 5 днів.

Що поставити: звіт з Meta Ads, скріншоти кампаній, статистика охоплень.

☒ Кроки

Приховати відмічені пункти

Видалити

40%

☒ Вибрати тизер (до 20 сек) для реклами

☒ Сформулювати заклик до дії (CTA) для поста

☐ Створити аудиторії (гео: Україна, вік: 16–60)

☐ Запустити кампанію (платформа Meta Ads Manager)

☐ Через 3 дні перевірити результат і оптимізувати

Додати пункт

Посилання на чат: <https://chatgpt.com/share/6858f5e8-f86c-8002-adc5-35f9dba6d851>.

Порівняння

Використання штучного інтелекту прискорює виконання, але довіряти таким інструментам не варто, бо інформація може бути вигадана.

Критерій	Самостійне виконання	Використання ШІ
Точність	+	-
Швидкість	-	+
Надійність	+ -	-
Розуміння предметної області	+	-
