

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №12

Тема «Контроль за ходом реалізації проєкту методом освоєного обсягу»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Камінська Ж.К.

2025

МЕТА

Розробити опорний план проєкту і провести аналіз і прогнозування ходу виконання проєкту методом освоєного обсягу.

ЗАВДАННЯ

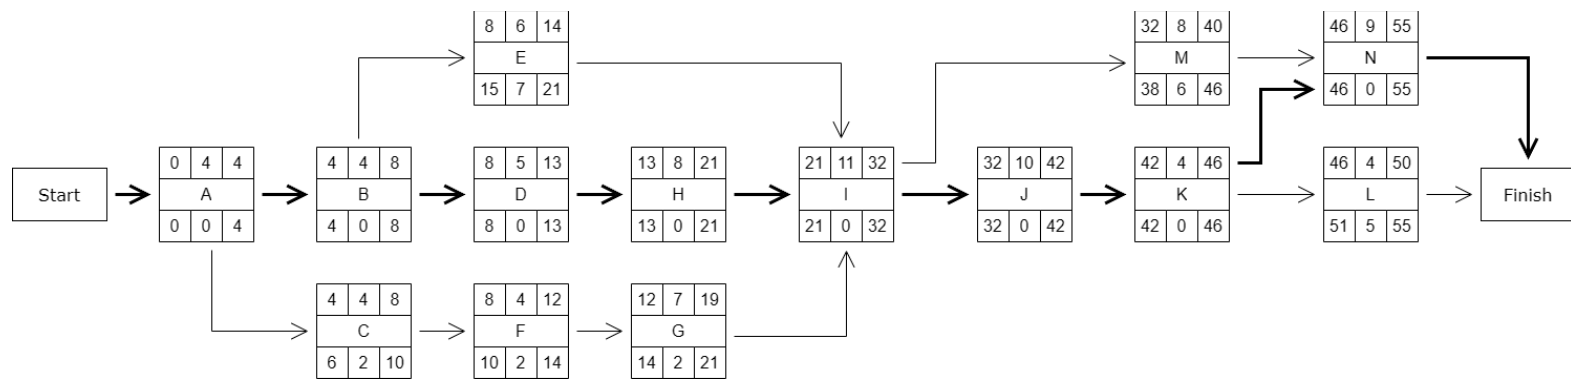


Рисунок 0.1 — Мережевий графік (взято з роботи №8)

1. Мережевий графік проєкту взяти з роботи №7.
2. Побудувати опорний плану проєкту, використовуючи дані про тривалість та вартість робіт, наведених в табл. 12.3.

Таблиця 12.3 – Вихідні дані для методу освоєного обсягу

Робота	Тривалість	Попередня робота	Вартість в день, тисяч	ВАС	Вартість, тисяч
A	4		12		48
B	4	A	10		40
C	4	A	10		40
D	5	B	4		20
E	6	B	11		66
F	4	C	8		32
G	7	F	10		70
H	8	D	12		96
I	11	E, H, G	4		44
J	10	I	7		70
K	4	J	11		44
L	4	K	6		24
M	8	I	20		160
N	9	K, M	15		135

3. Побудувавши опорний план, за узгодженням з викладачем назначити параметри виконання проєкту на випадкову дату.
4. Створити звіт за проєктом методом освоєного обсягу.
5. Проаналізувати стан проєкту, оцінити прогнозовану вартість проєкту та зробити висновки.

Виконання

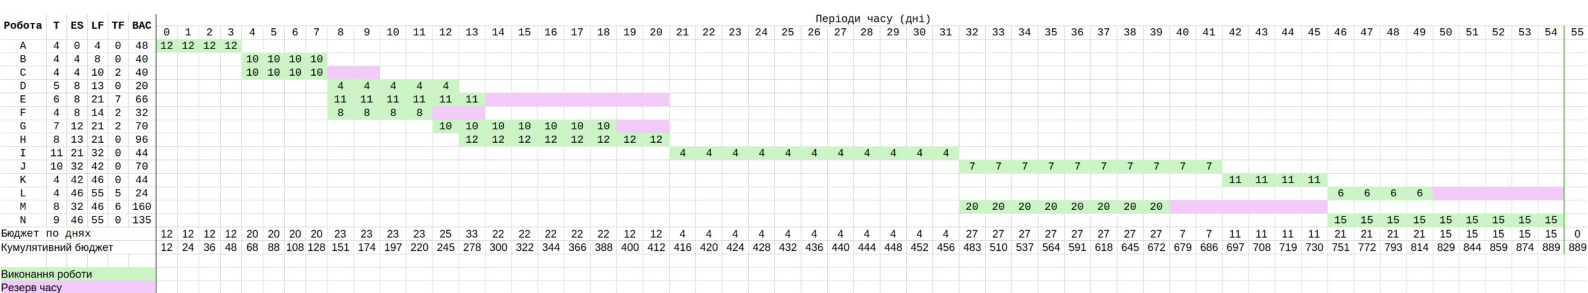


Рисунок 1.1 — Опорний графік

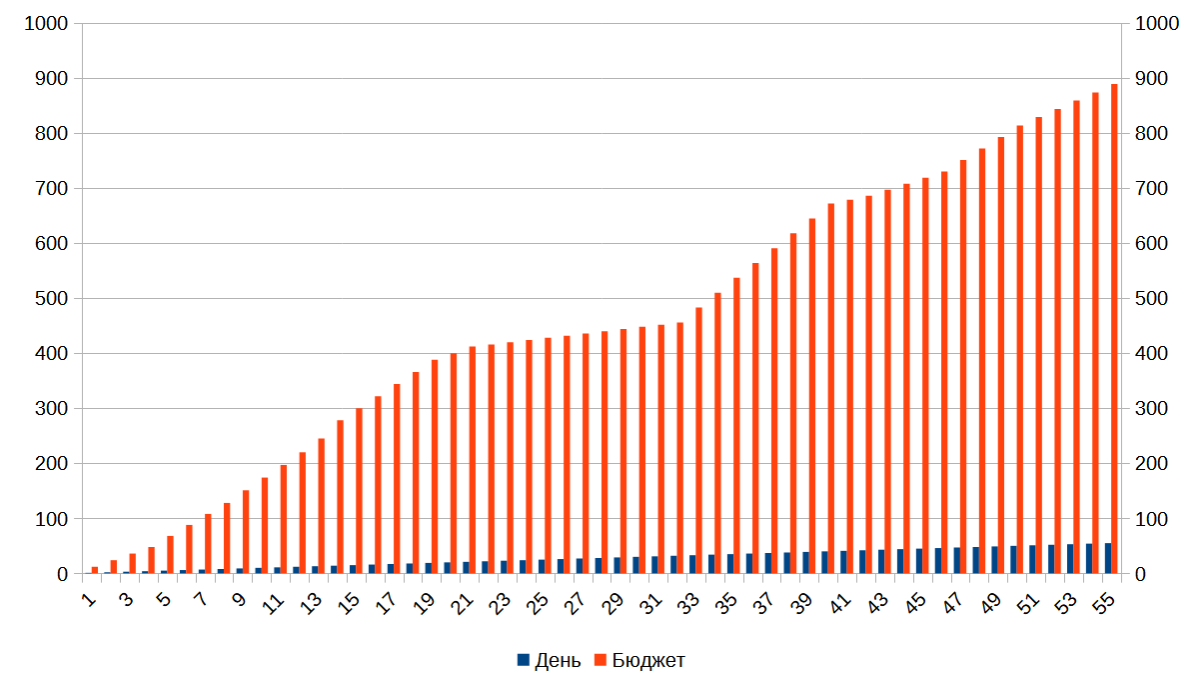


Рисунок 1.2 — Графік кумулятивних витрат

Звіт про статус проєкту на п'ятнадцятий день:

А. завершена за 4 дні, фактична вартість 48 тисяч.

В. завершена за 5 днів (замість 4 запланованих), фактична вартість 50 тисяч.

С. затримана на 1 день, почата на п'ятий день і завершена за 4 дні, фактична вартість 40 тисяч.

Д. початок перенесено на дев'ятий день (замість запланованого 8-ого), бо попередня робота В затрималась на день. Виконано за 5 днів, фактична вартість 20 тисяч.

Е. початок теж перенесено на дев'ятий день замість восьмого через затримку попередньої роботи В, виконано на 85% і потребуватиме мінімум 7 днів на виконання. Фактична вартість 66 тисяч.

ґ. початок перенесено на дев'ятий день замість восьмого через затримку роботи С. Виконано за 4 дні, фактична вартість 32 тисячі.

Г. початок перенесено на тринадцятий день через перенесення попередньої роботи ґ. Виконано майже на 30%, фактична вартість 20 тисяч.

Н. початок перенесено на чотирнадцятий день через перенесення попередньої роботи Д. Виконано приблизно на 12%, фактична вартість 12 тисяч.

Робота	T	ES	LF	TF	BAC	Періоди часу (дні)															
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	4	0	4	0	48	12	12	12	12												
B	4	4	8	0	40					10	10	10	10								
C	4	4	10	2	40					10	10	10	10								
D	5	8	13	0	20									4	4	4	4	4			
E	6	8	21	7	66									11	11	11	11	11	11		
F	4	8	14	2	32									8	8	8	8				
G	7	12	21	2	70																
H	8	13	21	0	96																
I	11	21	32	0	44																
J	10	32	42	0	70																
K	4	42	46	0	44																
L	4	46	55	5	24																
M	8	32	46	6	160																
N	9	46	55	0	135																
Бюджет по днях						12	12	12	12	20	20	20	20	23	23	23	23	25	33	22	22
Кумулятивний бюджет						12	24	36	48	68	88	108	128	151	174	197	220	245	278	300	322
Виконання роботи																					
Резерв часу																					
Дата звіту																					
Критичний шлях																					

Рисунок 1.3 — Звітний період

Затримка роботи В і її послідовників D та Н призводить до потреби переробити календарний графік, бо ці роботи лежать на критичному шляху. Зсув робіт С, Е, F, та G на календарний графік не вплинуть.
